




Midterm review 2^e fase ZON


4 juli 2025
RBO Rijn-Oost

Structuur deltaprogramma

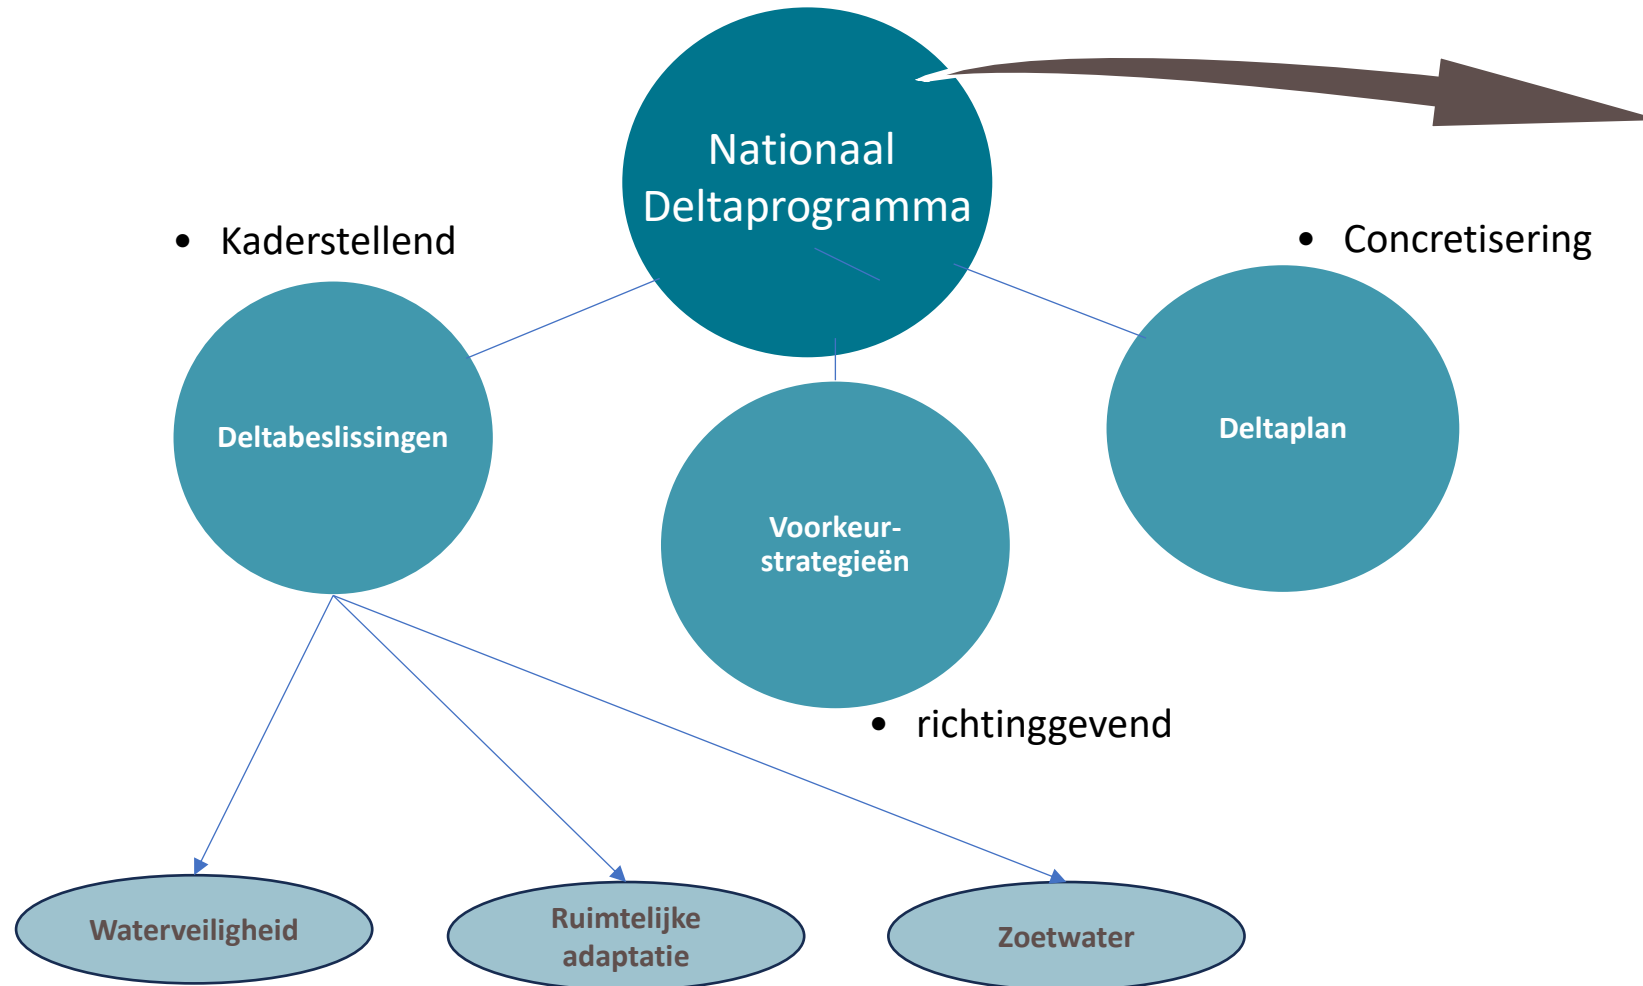

- Zet de koers uit voor de toekomst
- Ondersteunt met een Deltafonds

Wie doet wat?

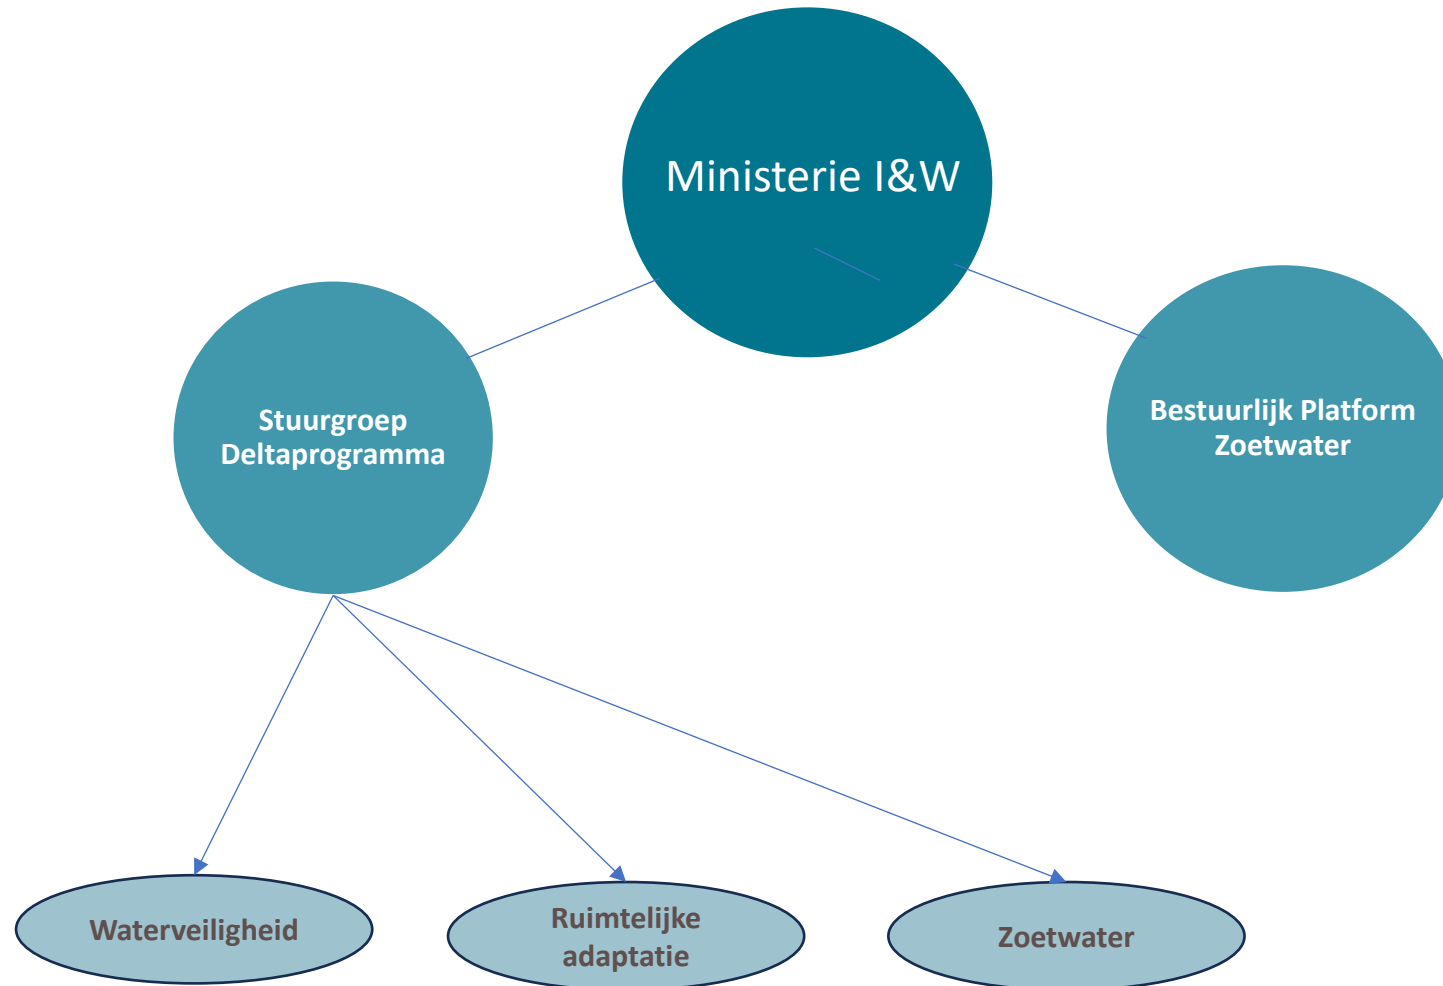


- Zoetwaterregio's en hoofdwatersysteem





- Regionale afstemming via RBO Rijn-Oost

Bestuursakkoord ZON fase 2 (2022-2027)

2016 - 2021	2022 - 2027	2028 - 2033	2034 - 2039	2040 - 2045	2046 - 2051
Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6

- 
- Werkprogramma regio ZON voor 2^e fase
 - Programmatische aanpak
 - Ondertekend door 66 partners
 - Voor € 200 miljoen aan investeringen, waarvan € 50 miljoen uit Deltafonds
 - Deltafonds = SPUK-regeling = verantwoording aan het Rijk

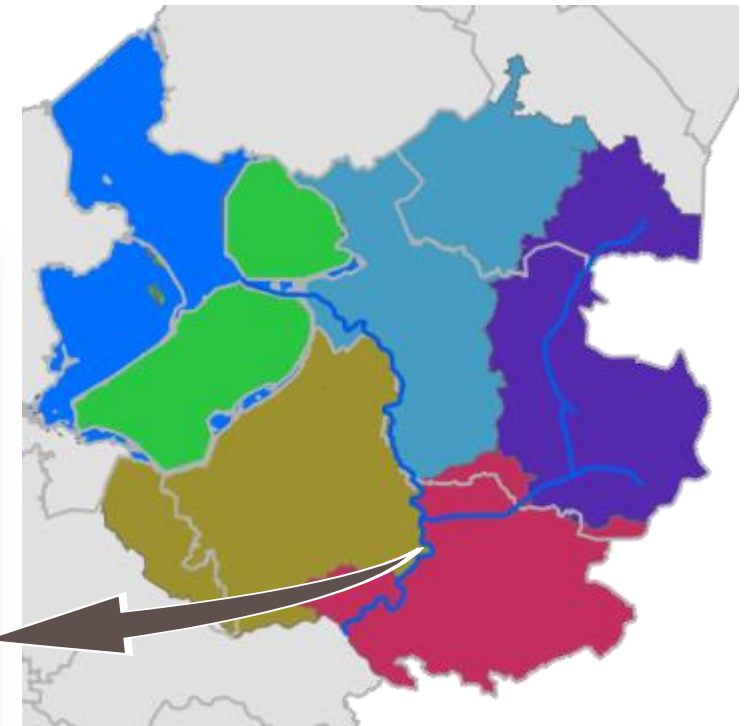


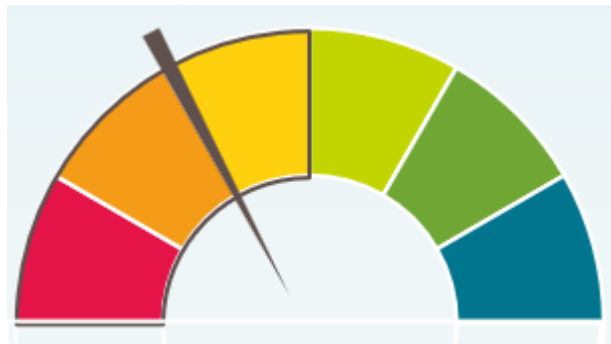


Investerings


Voor fase 2 is voor € 200 miljoen aan investeringen ingebracht, waarvan € 50 miljoen aan subsidie uit het Deltafonds voor uitvoer van zoetwatermaatregelen.

Investerings per soort organisatie

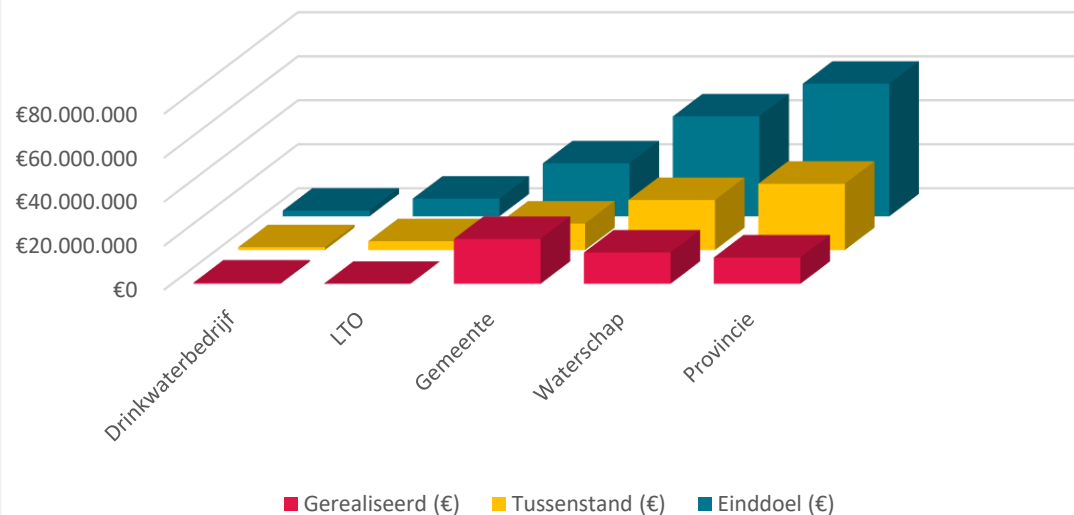

Investerings per type maatregelen

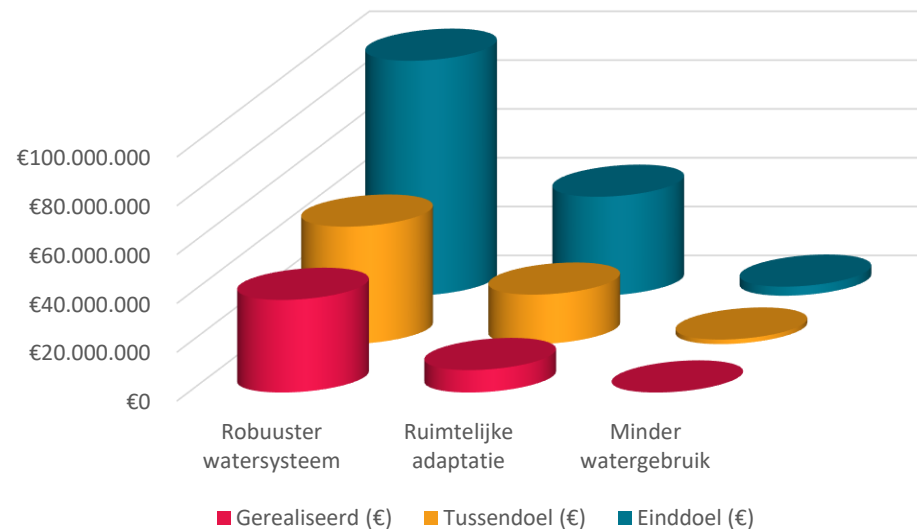


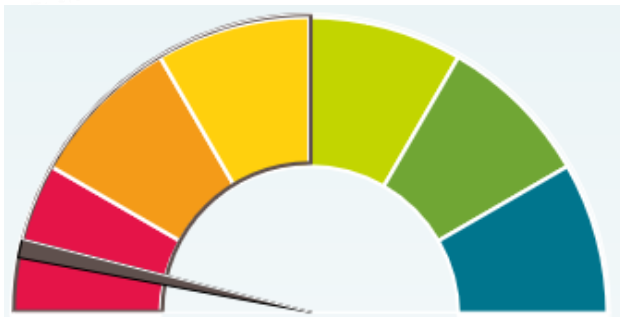


Inspanningen


Voor fase 2 is in het regionale bestuursakkoord voor een areaal van 120.000 ha aan maatregelen afgesproken; variërend van herinrichting om beter water vast te houden, verminderen waterverbruik tot functieverandering.

Opgave (ha) per soort organisatie

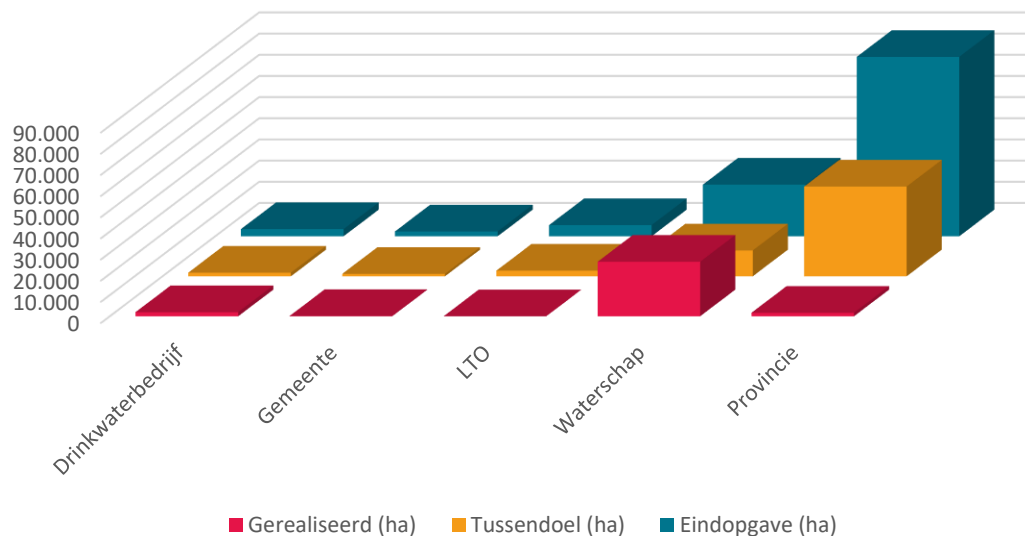

Opgave (ha) per type maatregelen

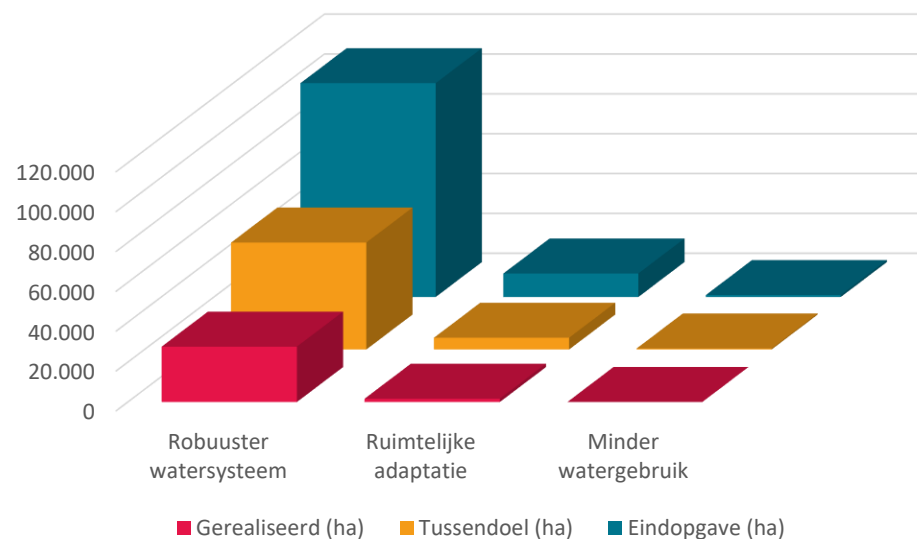


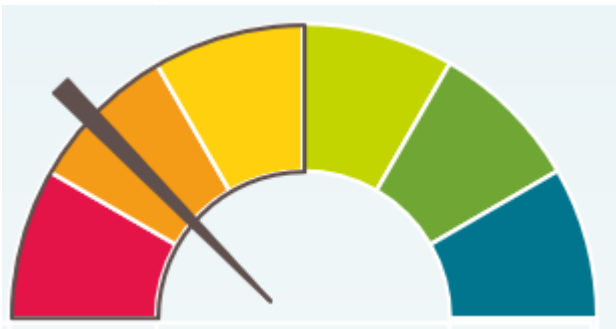


Effecten

Elk type maatregel is vertaald naar het aantal mm dat het bijdraagt aan de grondwatervoorraad. Alle maatregelen uit fase 2 samen voegen jaarlijks circa 62 miljoen m³ water toe aan het grondwater.

Effect (Mm³) per soort organisatie

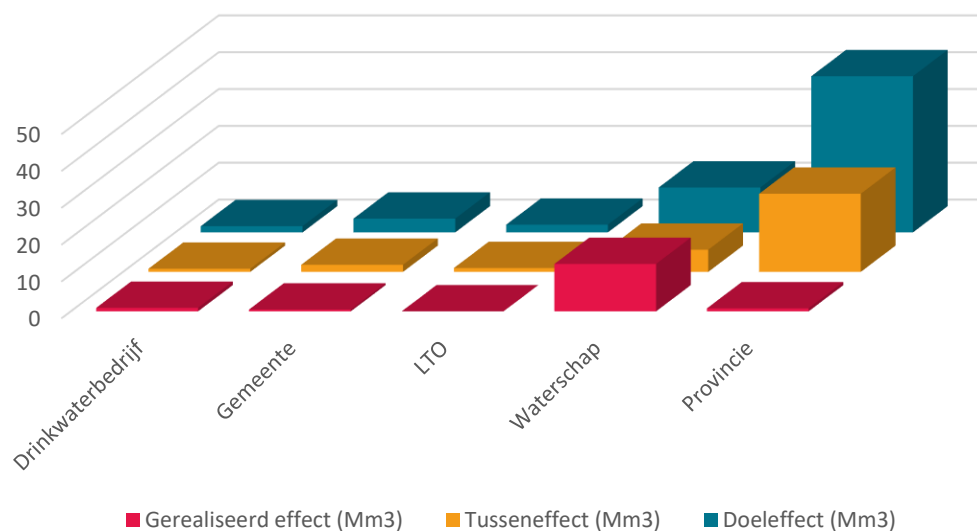

Effect (Mm³) per type maatregelen

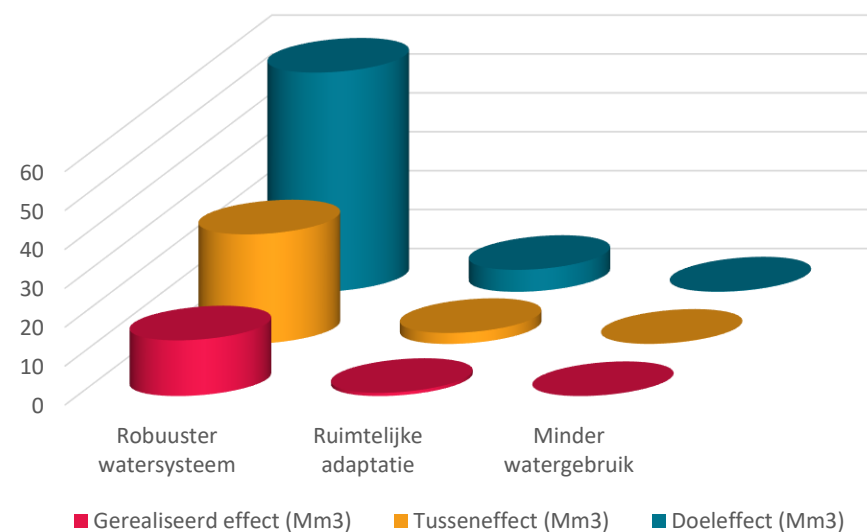



Prognose



De looptijd van fase 2 van het werkprogramma ZON is tot eind 2027. Conform de SPUK-regeling investeren we 200 miljoen € voor eind 2027.

Kijkend naar de afgesproken hectares, behelst ons werkprogramma niet 20% maar 13% van ons areaal. Daarmee lopen we achter t.o.v. de geformuleerde ambitie over arealen.

Afkoppelprojecten – relatie met gemeenten


- Afkoppelprojecten waren de enige maatregelen met een normbedrag
- Door inflatie, capaciteitsgebrek etc is huidige kostprijs veel hoger; vooral IT-riolen passen niet
- Gevolg: wel investeringsbedragen halen, maar niet de afgesproken aantal hectares
- 4 juli RBO met vraag om opdracht te verlenen tot een voorstel voor een nieuw normbedrag
 - Mits akkoord: aanpassing van hectares
 - Melden bij BPZ



Voorbereiding fase 3

4 juli 2025
RBO Rijn-Oost

Voorbereiding fase 3 (2028 - 2033)




Landelijk

- Herijking Deltaprogramma belangrijk proces
- Afvoerverdeling splitsingspunt Lobith

Regionaal

- Het [Zoetwaterverhaal van hoog Nederland](#)
- Regionale doelen opgesteld
- Voorbereiding onderbouwingsdocument maatregelen
- **Voorbereiding strategiedocument**
- Voorbereiding regionaal bod
- Voorbereiding bestuursakkoord

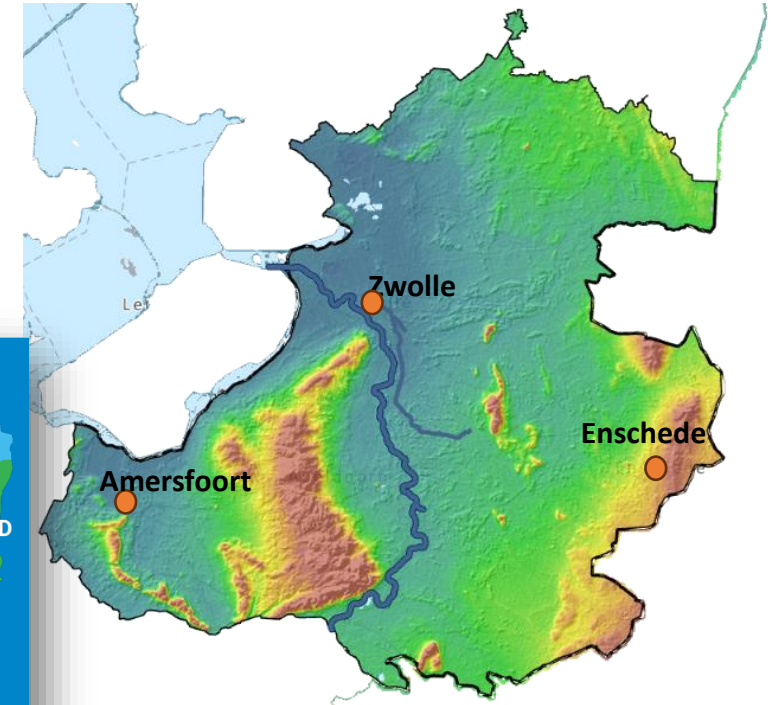

Vorbereiding strategiedocument (1)

Oude ambitie fase 2

- In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust
- Hiervan afgeleid is een concrete ambitie voor de korte termijn:
 - Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is 'het nieuwe normaal'
 - In 2027 voldoet 20% van het gebied aan de ambitie voor 2050



Vorbereiding strategiedocument (2)

Ingelast RBO 3 juni 2025

Waarom nu?

- Tempo voor het realiseren van maatregelen ligt lager dan ingeschat
- Klimaatscenario's laten zien dat de werkopgave groter is
- Andere ambitie, in plaats van 20% oppervlakte nu 100 mm (zie regionale doelen document)

>> nieuwe strategie nodig


Waarom samen?

- Nieuwe strategie vraag om gezamenlijke keuzes
- We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (gedeeld grondwater, oppervlaktewater en hoofdwatersysteem (IJssel en kanalen)
- We zijn van elkaar afhankelijk, zowel in baten als lasten
- Met een gezamenlijke strategie staan we sterker

Vorbereiding strategiedocument (3)

Dilemma's afpellen

- Tot het niveau van het RBO
- Voedend voor het BPZ
- Passend bij voorbereiding herijking Deltaprogramma

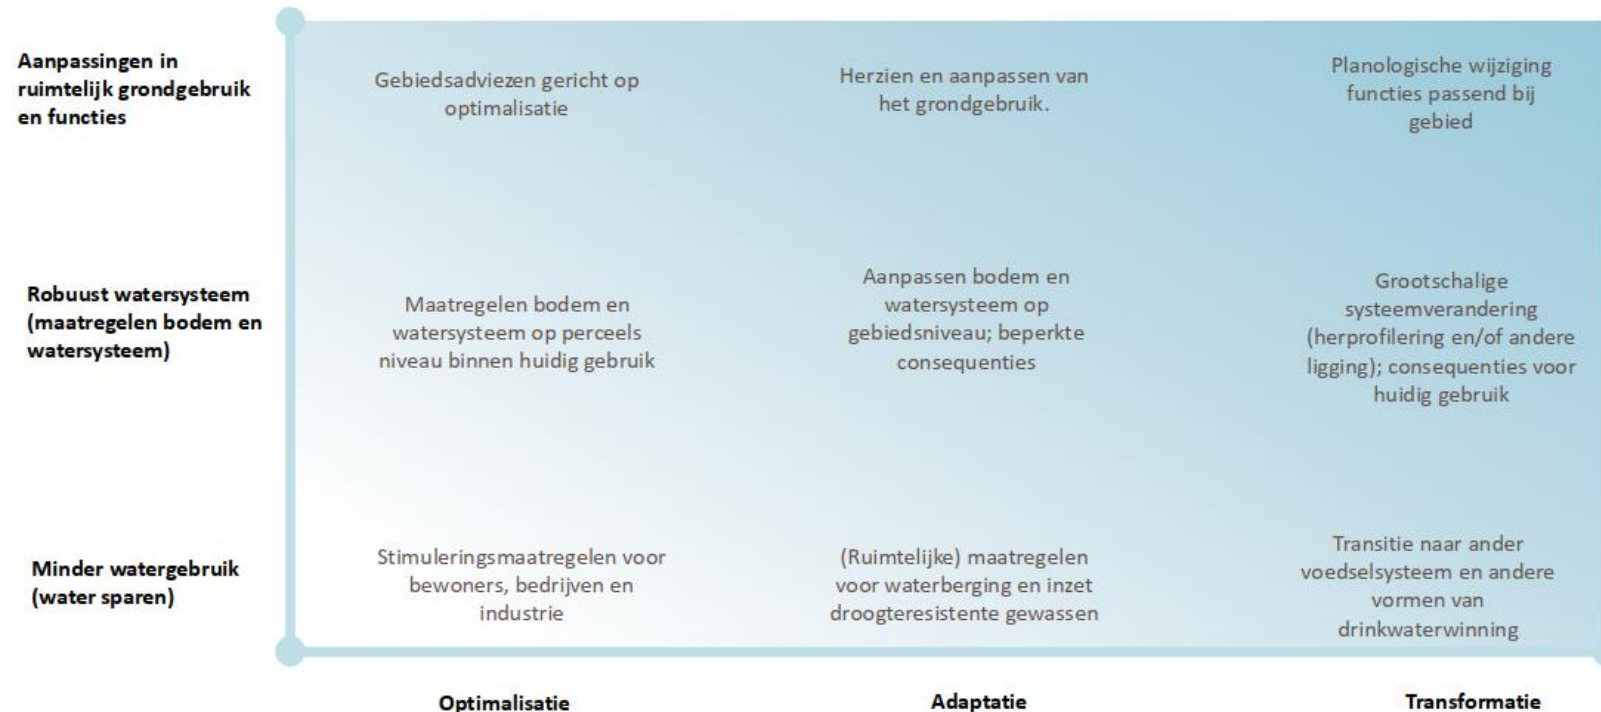

Vorbereiding strategiedocument (3)

- Op welke ambitie zet de regio in?
- Afhankelijkheid wateraanvoer?
- Waar en hoe gaan we aan de slag?
- Hoe stellen we ons als overheid op?
- Verdeling middelen stad-land?
- Hoe gaan we om met onzekerheden?
- Waar ligt het zwaartepunt?

1. Op welke ambitie zet de regio in?



2. Afhankelijkheid wateraanvoer?



3. Waar en hoe gaan we aan de slag?



4. Hoe stellen we ons als overheid op?



5. Verdeling middelen stad-land?



6. Hoe gaan we om met onzekerheden?



7. Waar ligt het zwaartepunt?



Vorbereiding strategiedocument (4)

Status proces

- Managementsamenvatting in RBO 4 juli 2025
- Schriftelijke ronde van 10 juli tot 1^e helft september
- Vaststelling in oktober
- **Daarna voorbereiden op regionaal bod**
- Hoogte Deltafonds nog onbekend
- Planning nog onbekend

